


El Paradigma Central: El Sprint

1

Duración Fija:

Iteraciones predecibles que oscilan por lo habitual entre 1 y 4 semanas.





2

Inmutable: Una vez iniciado, el sprint no puede ser extendido bajo ninguna circunstancia.




3

Aislado: Las iteraciones se realizan una tras otra, sin interrupciones, hasta terminar el proyecto.

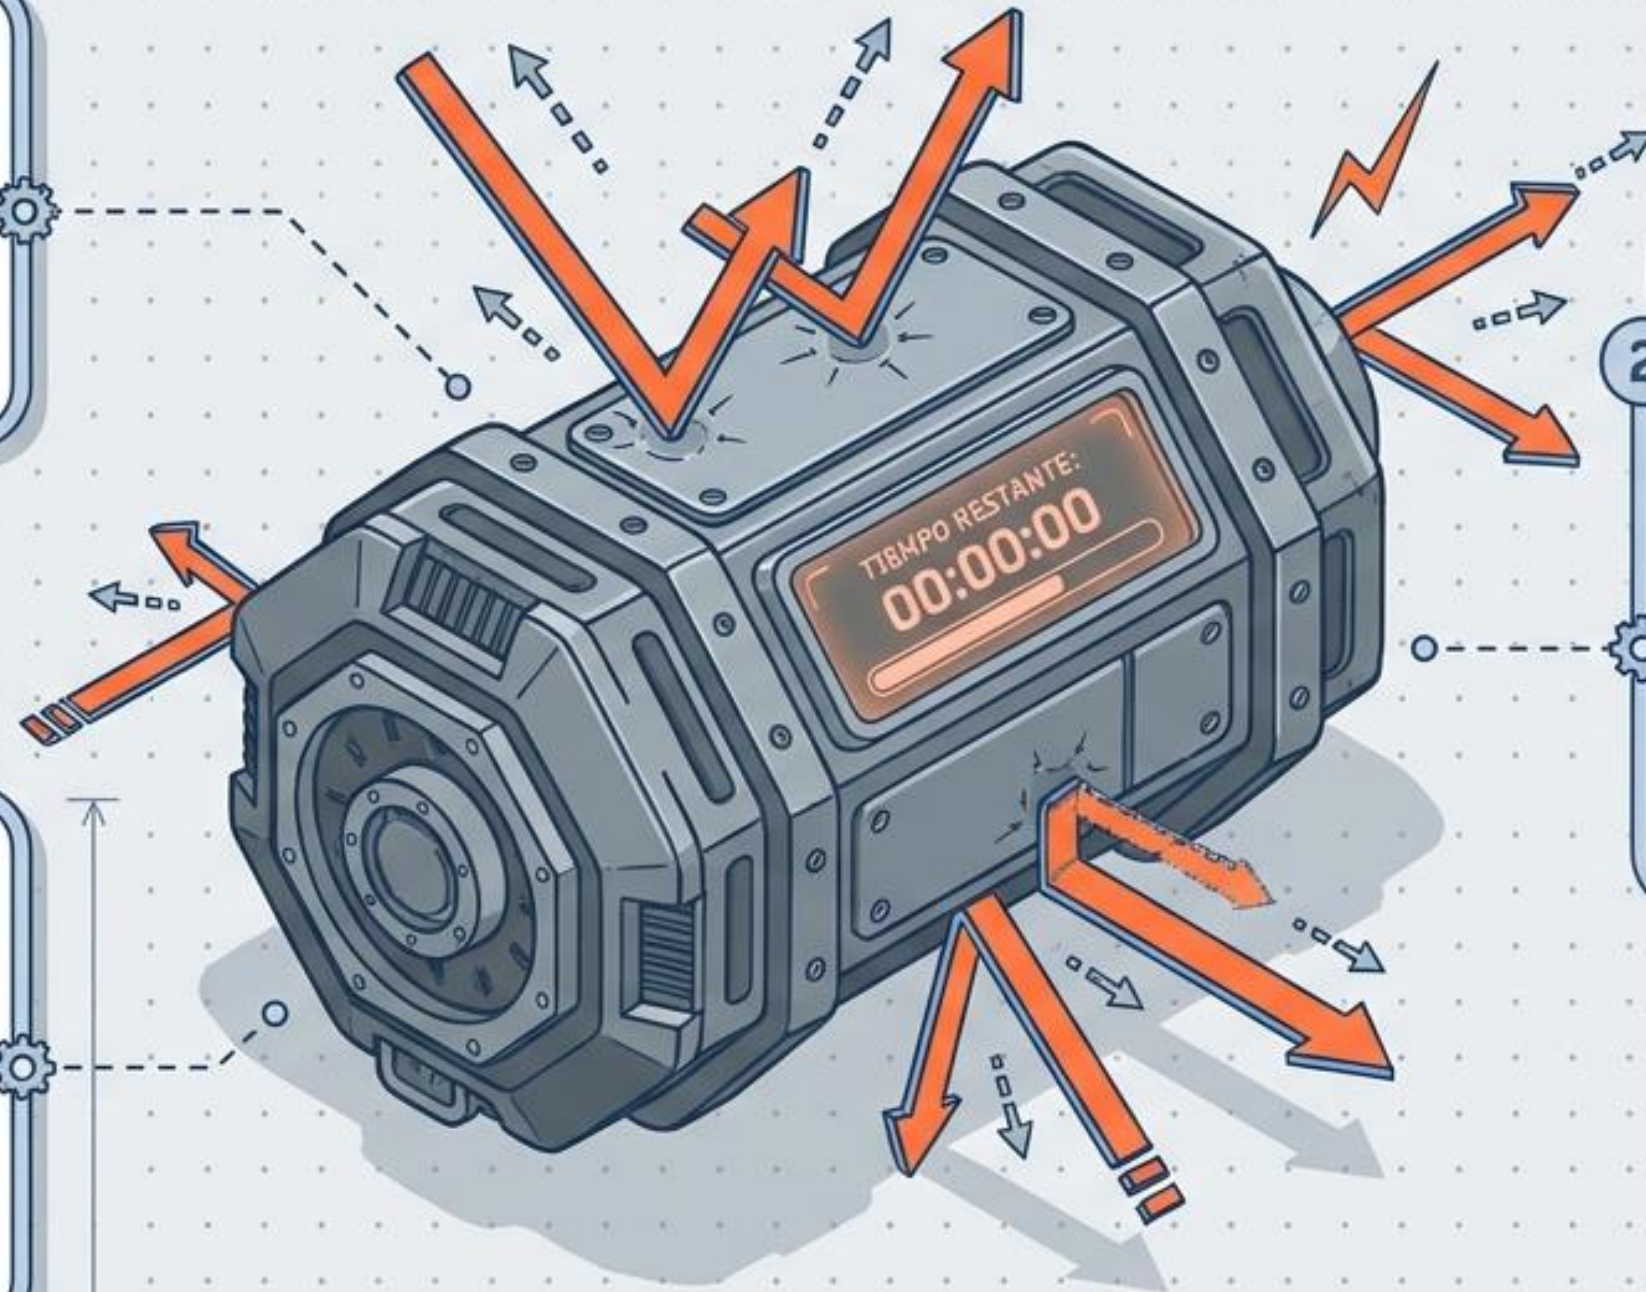


El Ciclo de Vida en 4 Fases

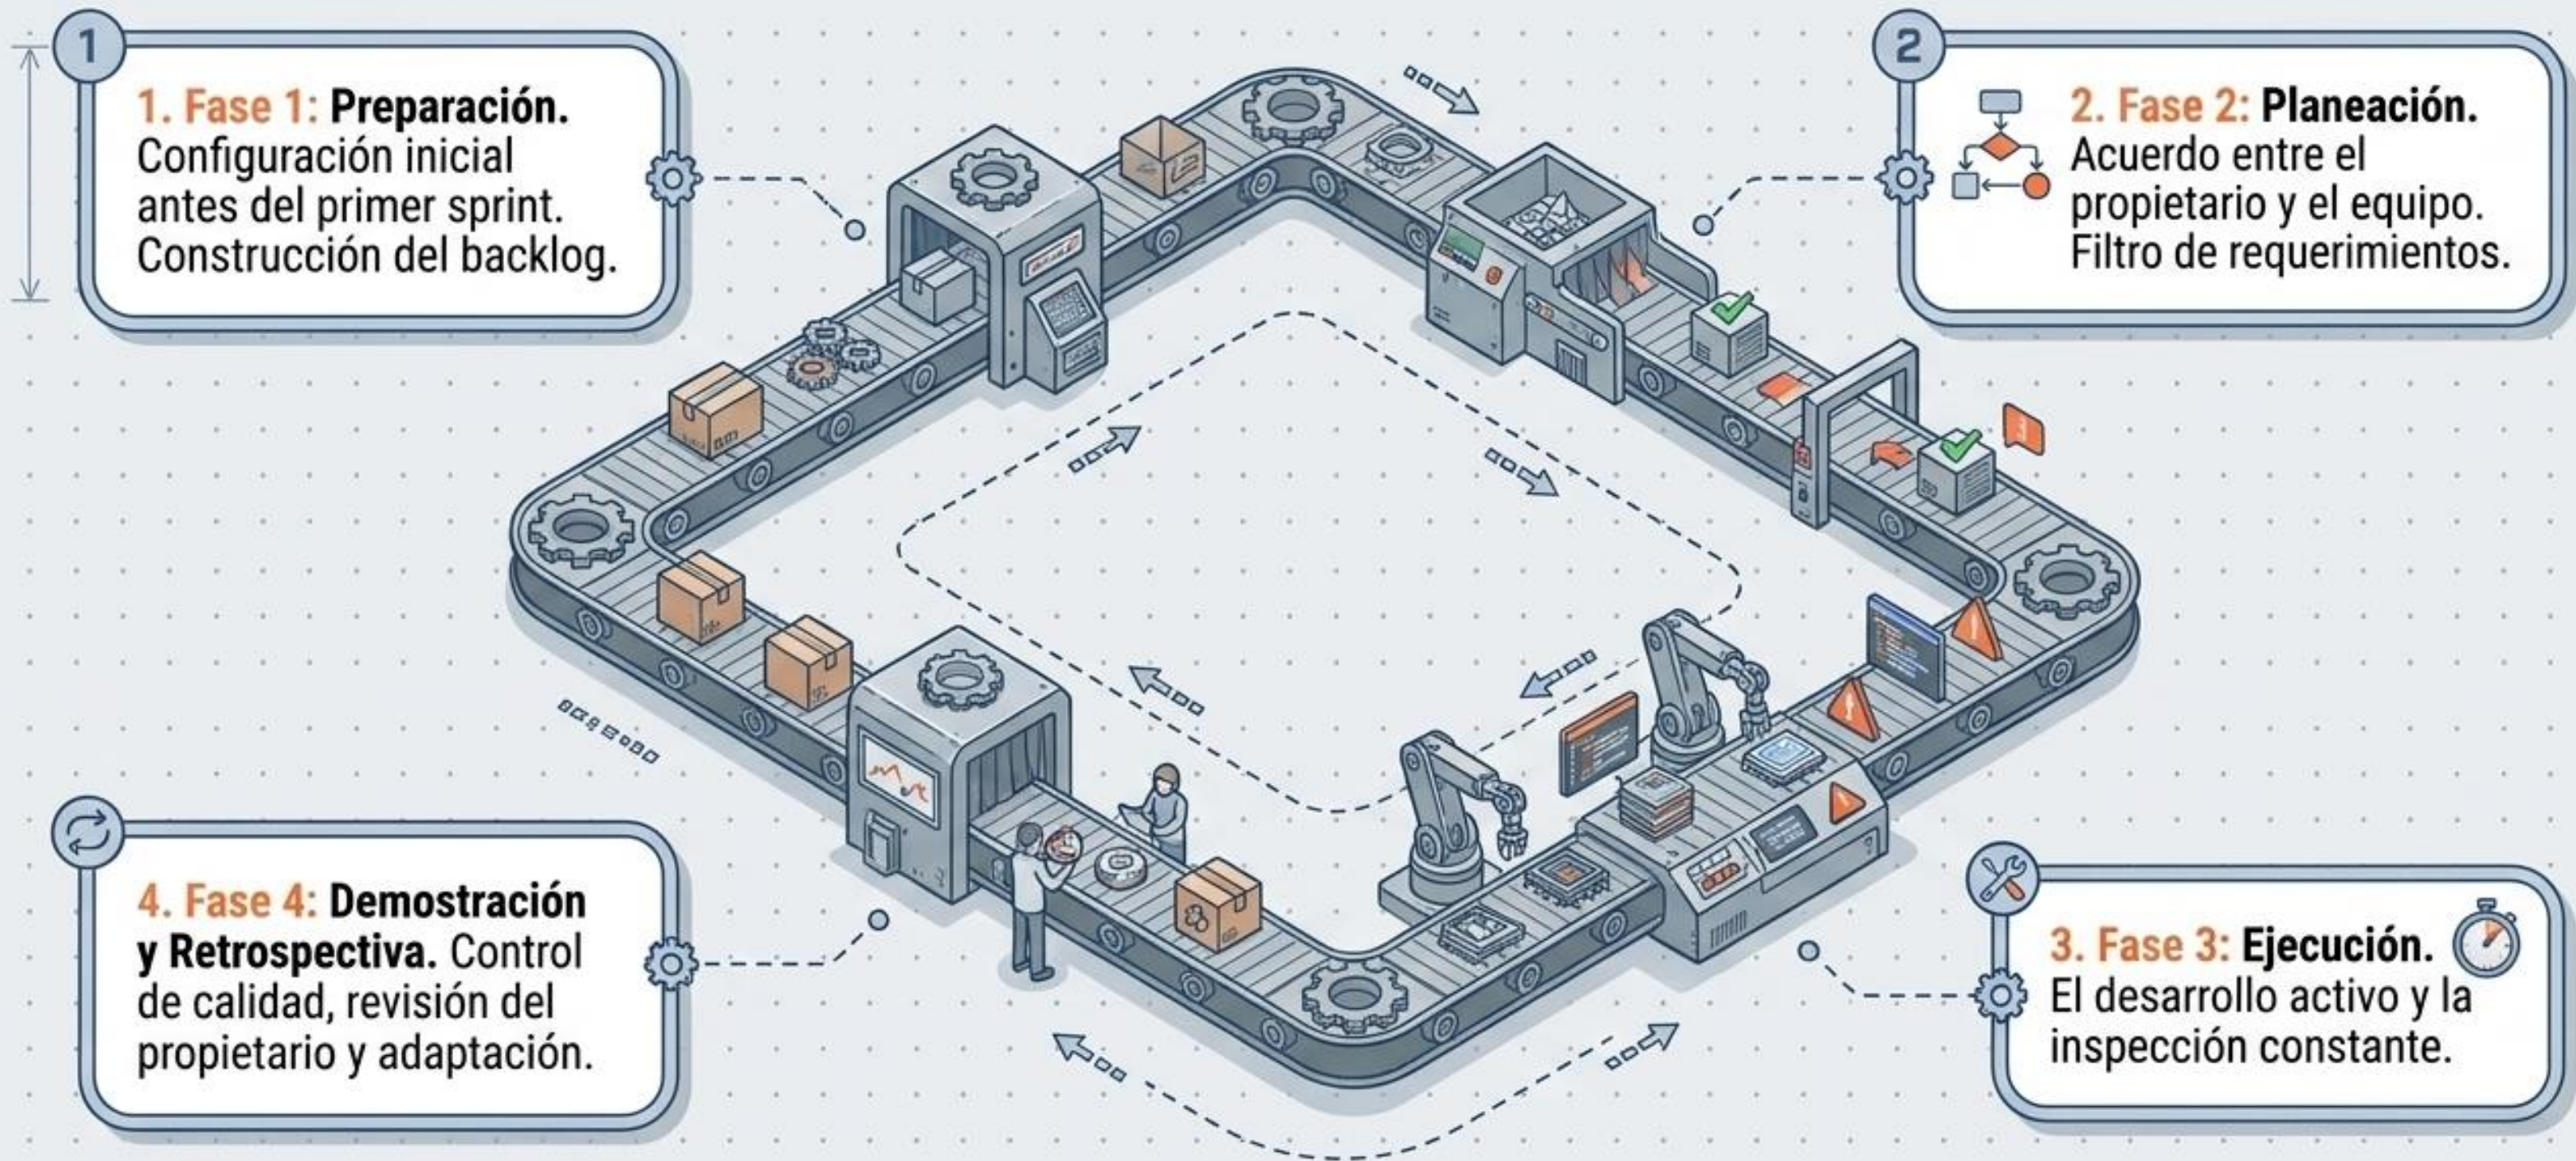


Fase 1: Preparación del Proyecto


El proceso inicia identificando los requerimientos del sistema antes de arrancar el primer sprint. El Maestro Scrum y el Propietario del Producto se reúnen para definir la visión inicial.

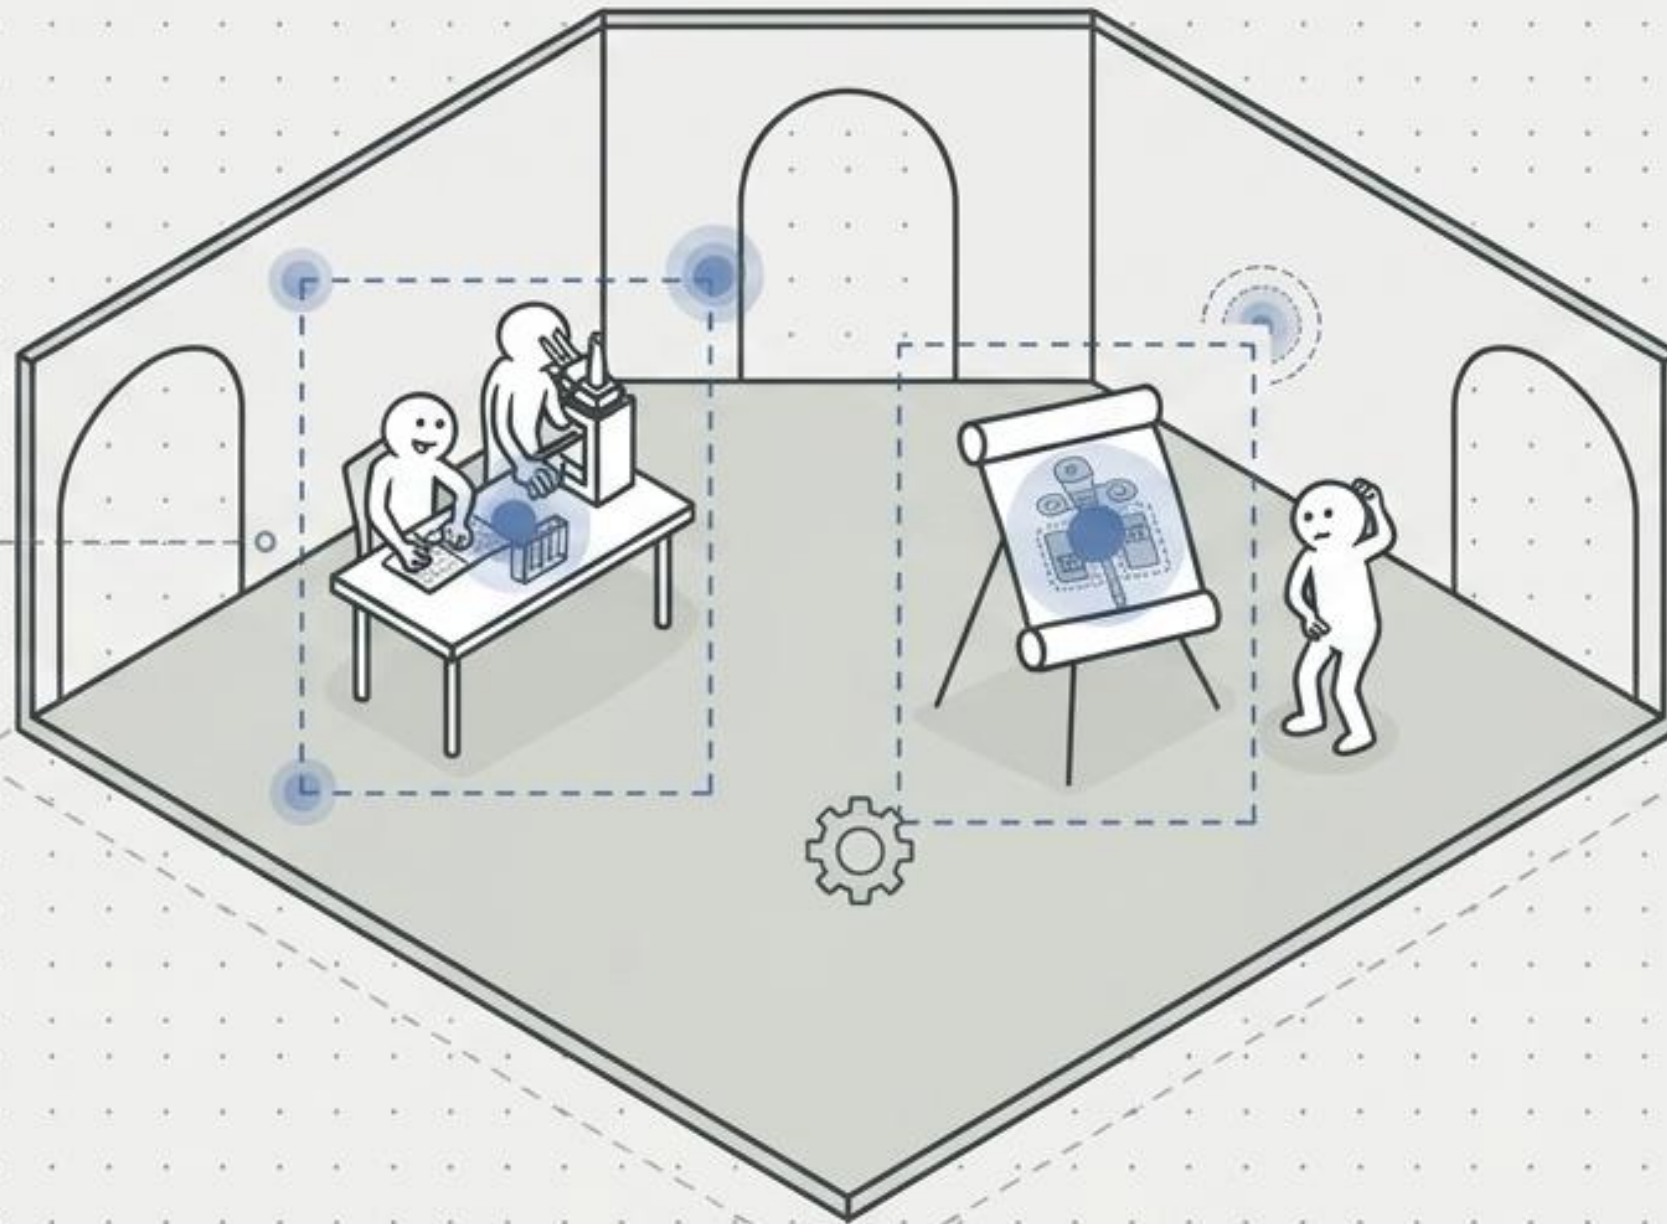

Del Requerimiento al Backlog

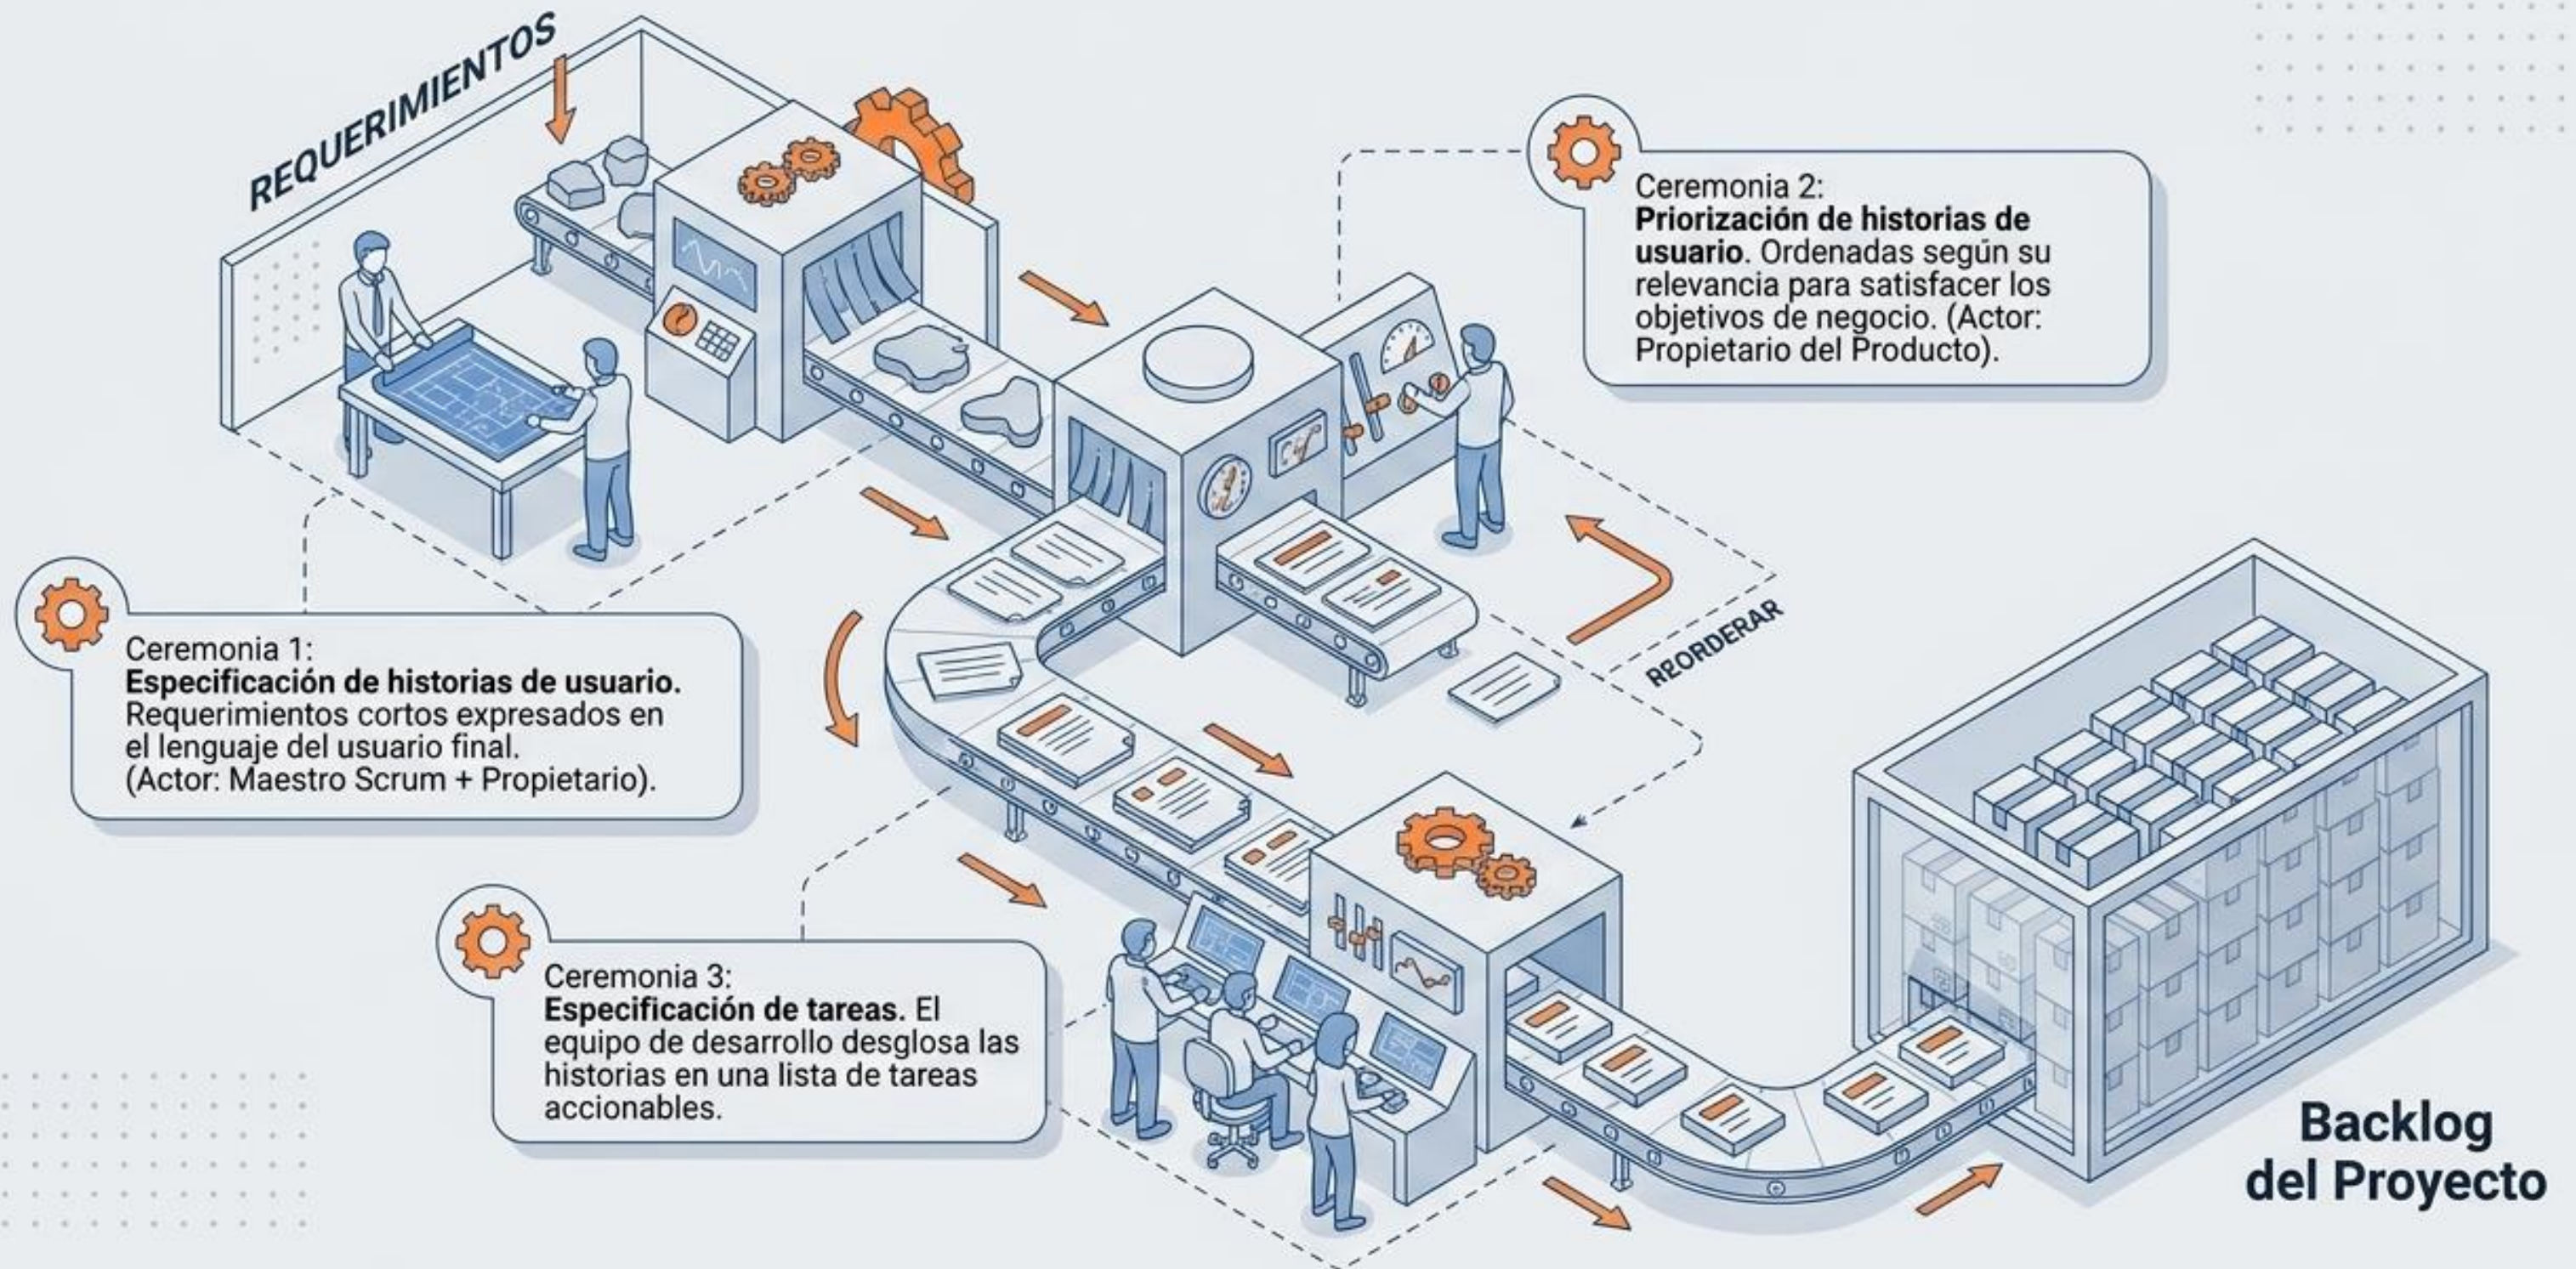

Estimación y Entregas

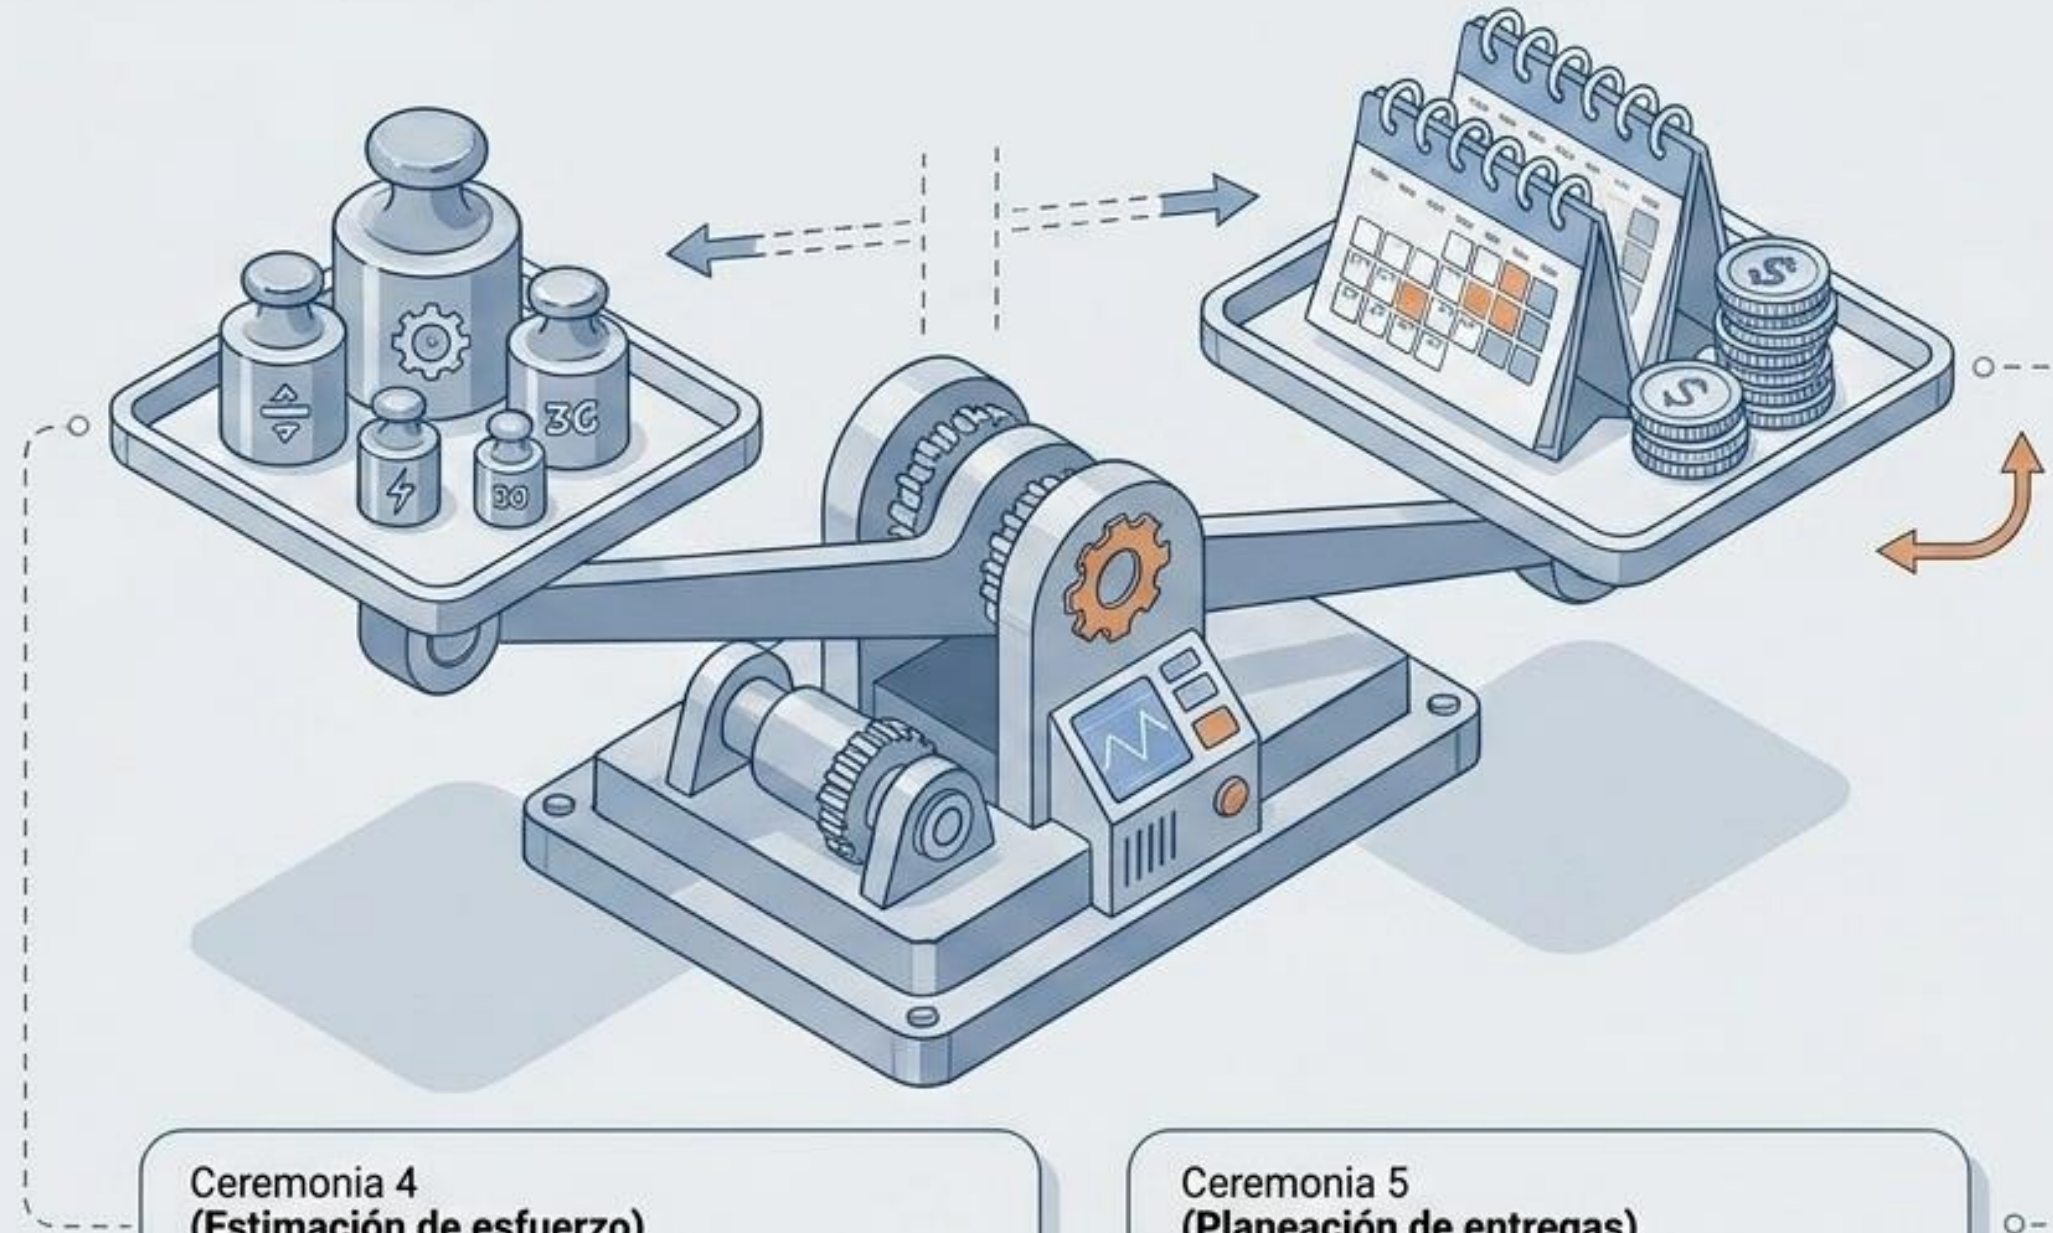

Ceremonia 4

(Estimación de esfuerzo)

El equipo asigna Puntos de la Historia (medidas relativas de complejidad).
Nota vital: Los resultados de esta estimación pueden hacer que el propietario cambie la visión de las prioridades.

Ceremonia 5

(Planeación de entregas)


Propietario y equipo acuerdan entregas. Se establece la cantidad de sprints, su duración y los costos generales del proyecto.

Matriz de Artefactos Fundamentales


	Historia de Usuario
	¿Qué es? Especificación corta del requerimiento. Lenguaje: Del usuario final. Propósito: Definir la necesidad del negocio.
	Tarea
	¿Qué es? Trabajo técnico específico a realizar. Lenguaje: Técnico/Desarrollo. Propósito: Desglosar la historia para su ejecución.
	Punto de Historia
	¿Qué es? Medida relativa. Lenguaje: Numérico/Proporcional. Propósito: Estimar la complejidad y esfuerzo del equipo.

Fases 2 y 3: Planeación y Ejecución

Las piezas entran a la línea de ensamble. El enfoque cambia de la visión a largo plazo a la ejecución inmediata dentro de un ciclo cerrado y sin interrupciones.

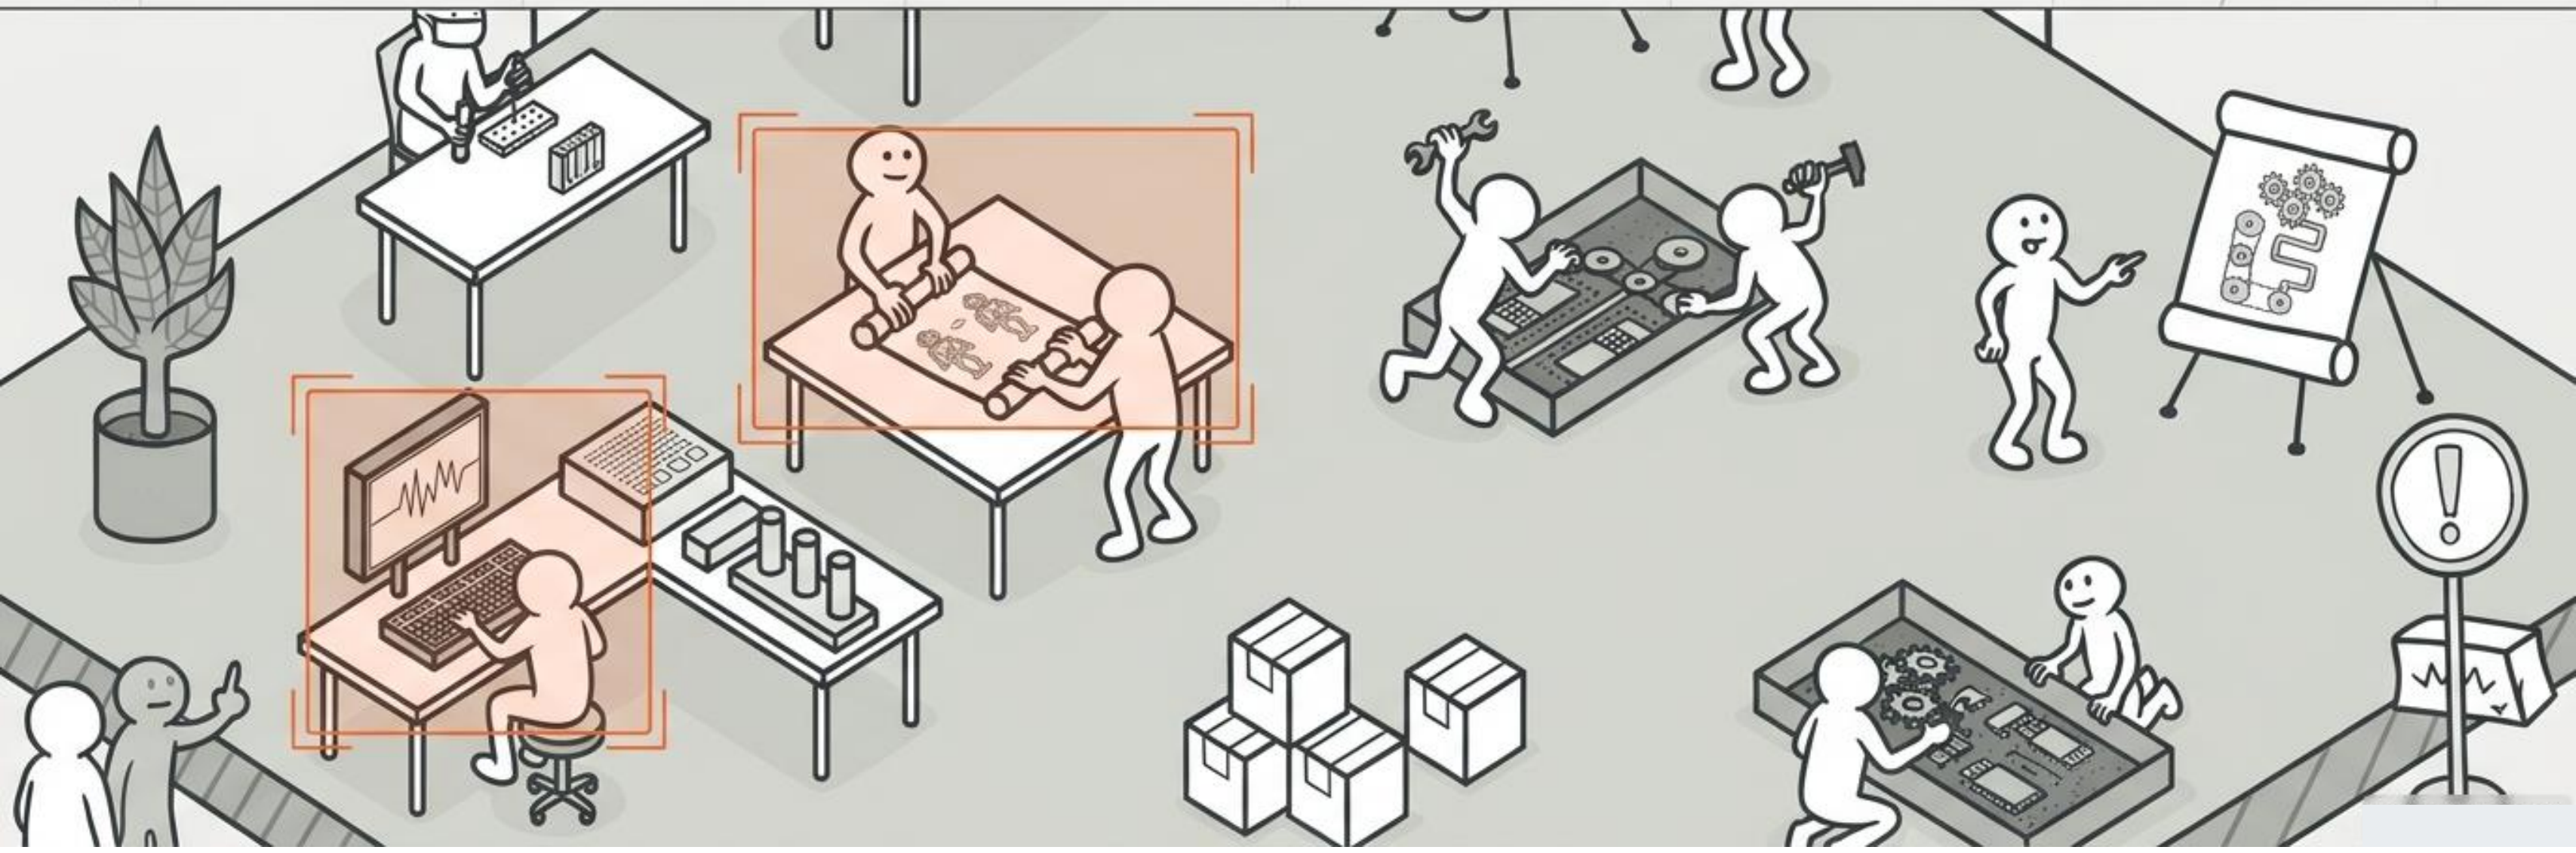

Alineando el Sprint

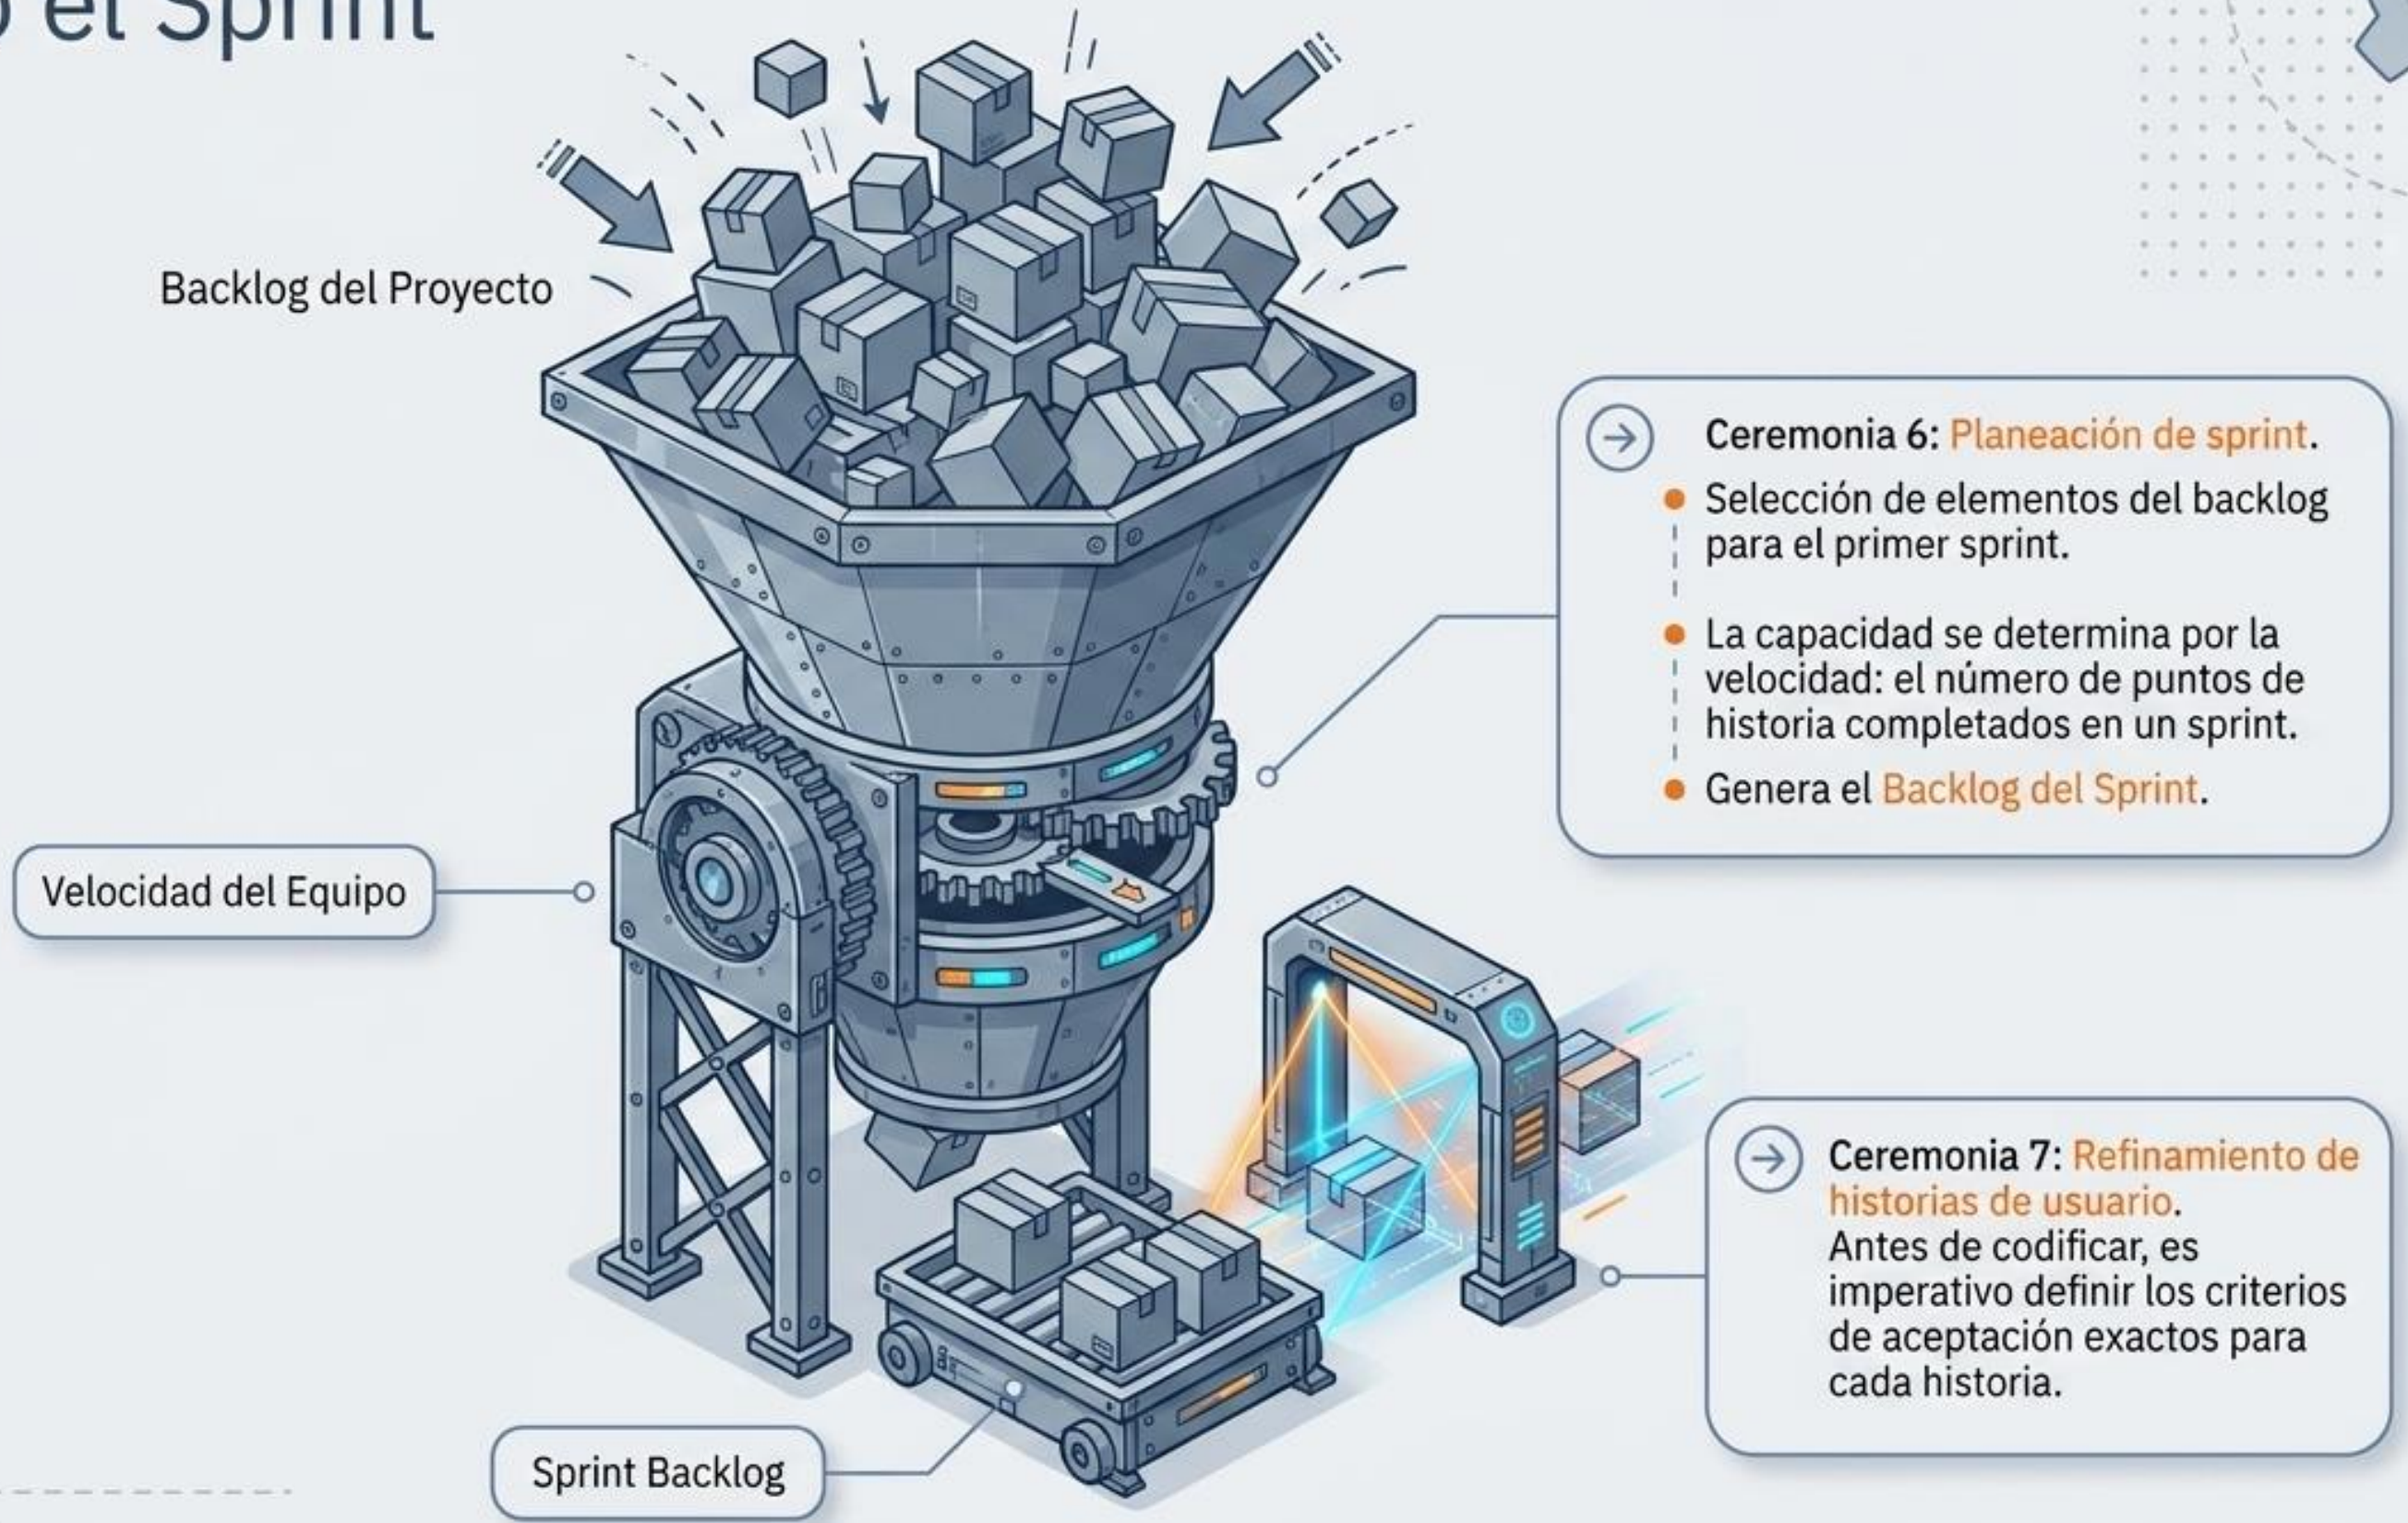

Desarrollo e Inspección

El Engrane Principal:

Ceremonia 8 (Desarrollo del producto).
La implementación física y técnica del software. Es el motor principal que consume el tiempo del sprint.




El Medidor de Precisión:


Ceremonia 9 (Junta diaria del sprint).
El equipo se reúne todos los días para inspeccionar el progreso, detectar bloqueos y ajustar el trabajo del día.

Fase 4: Demostración y Retrospectiva

El periodo de desarrollo concluye. El producto terminado sale a la luz para enfrentar el escrutinio, la validación del propietario y el análisis crítico del propio equipo.

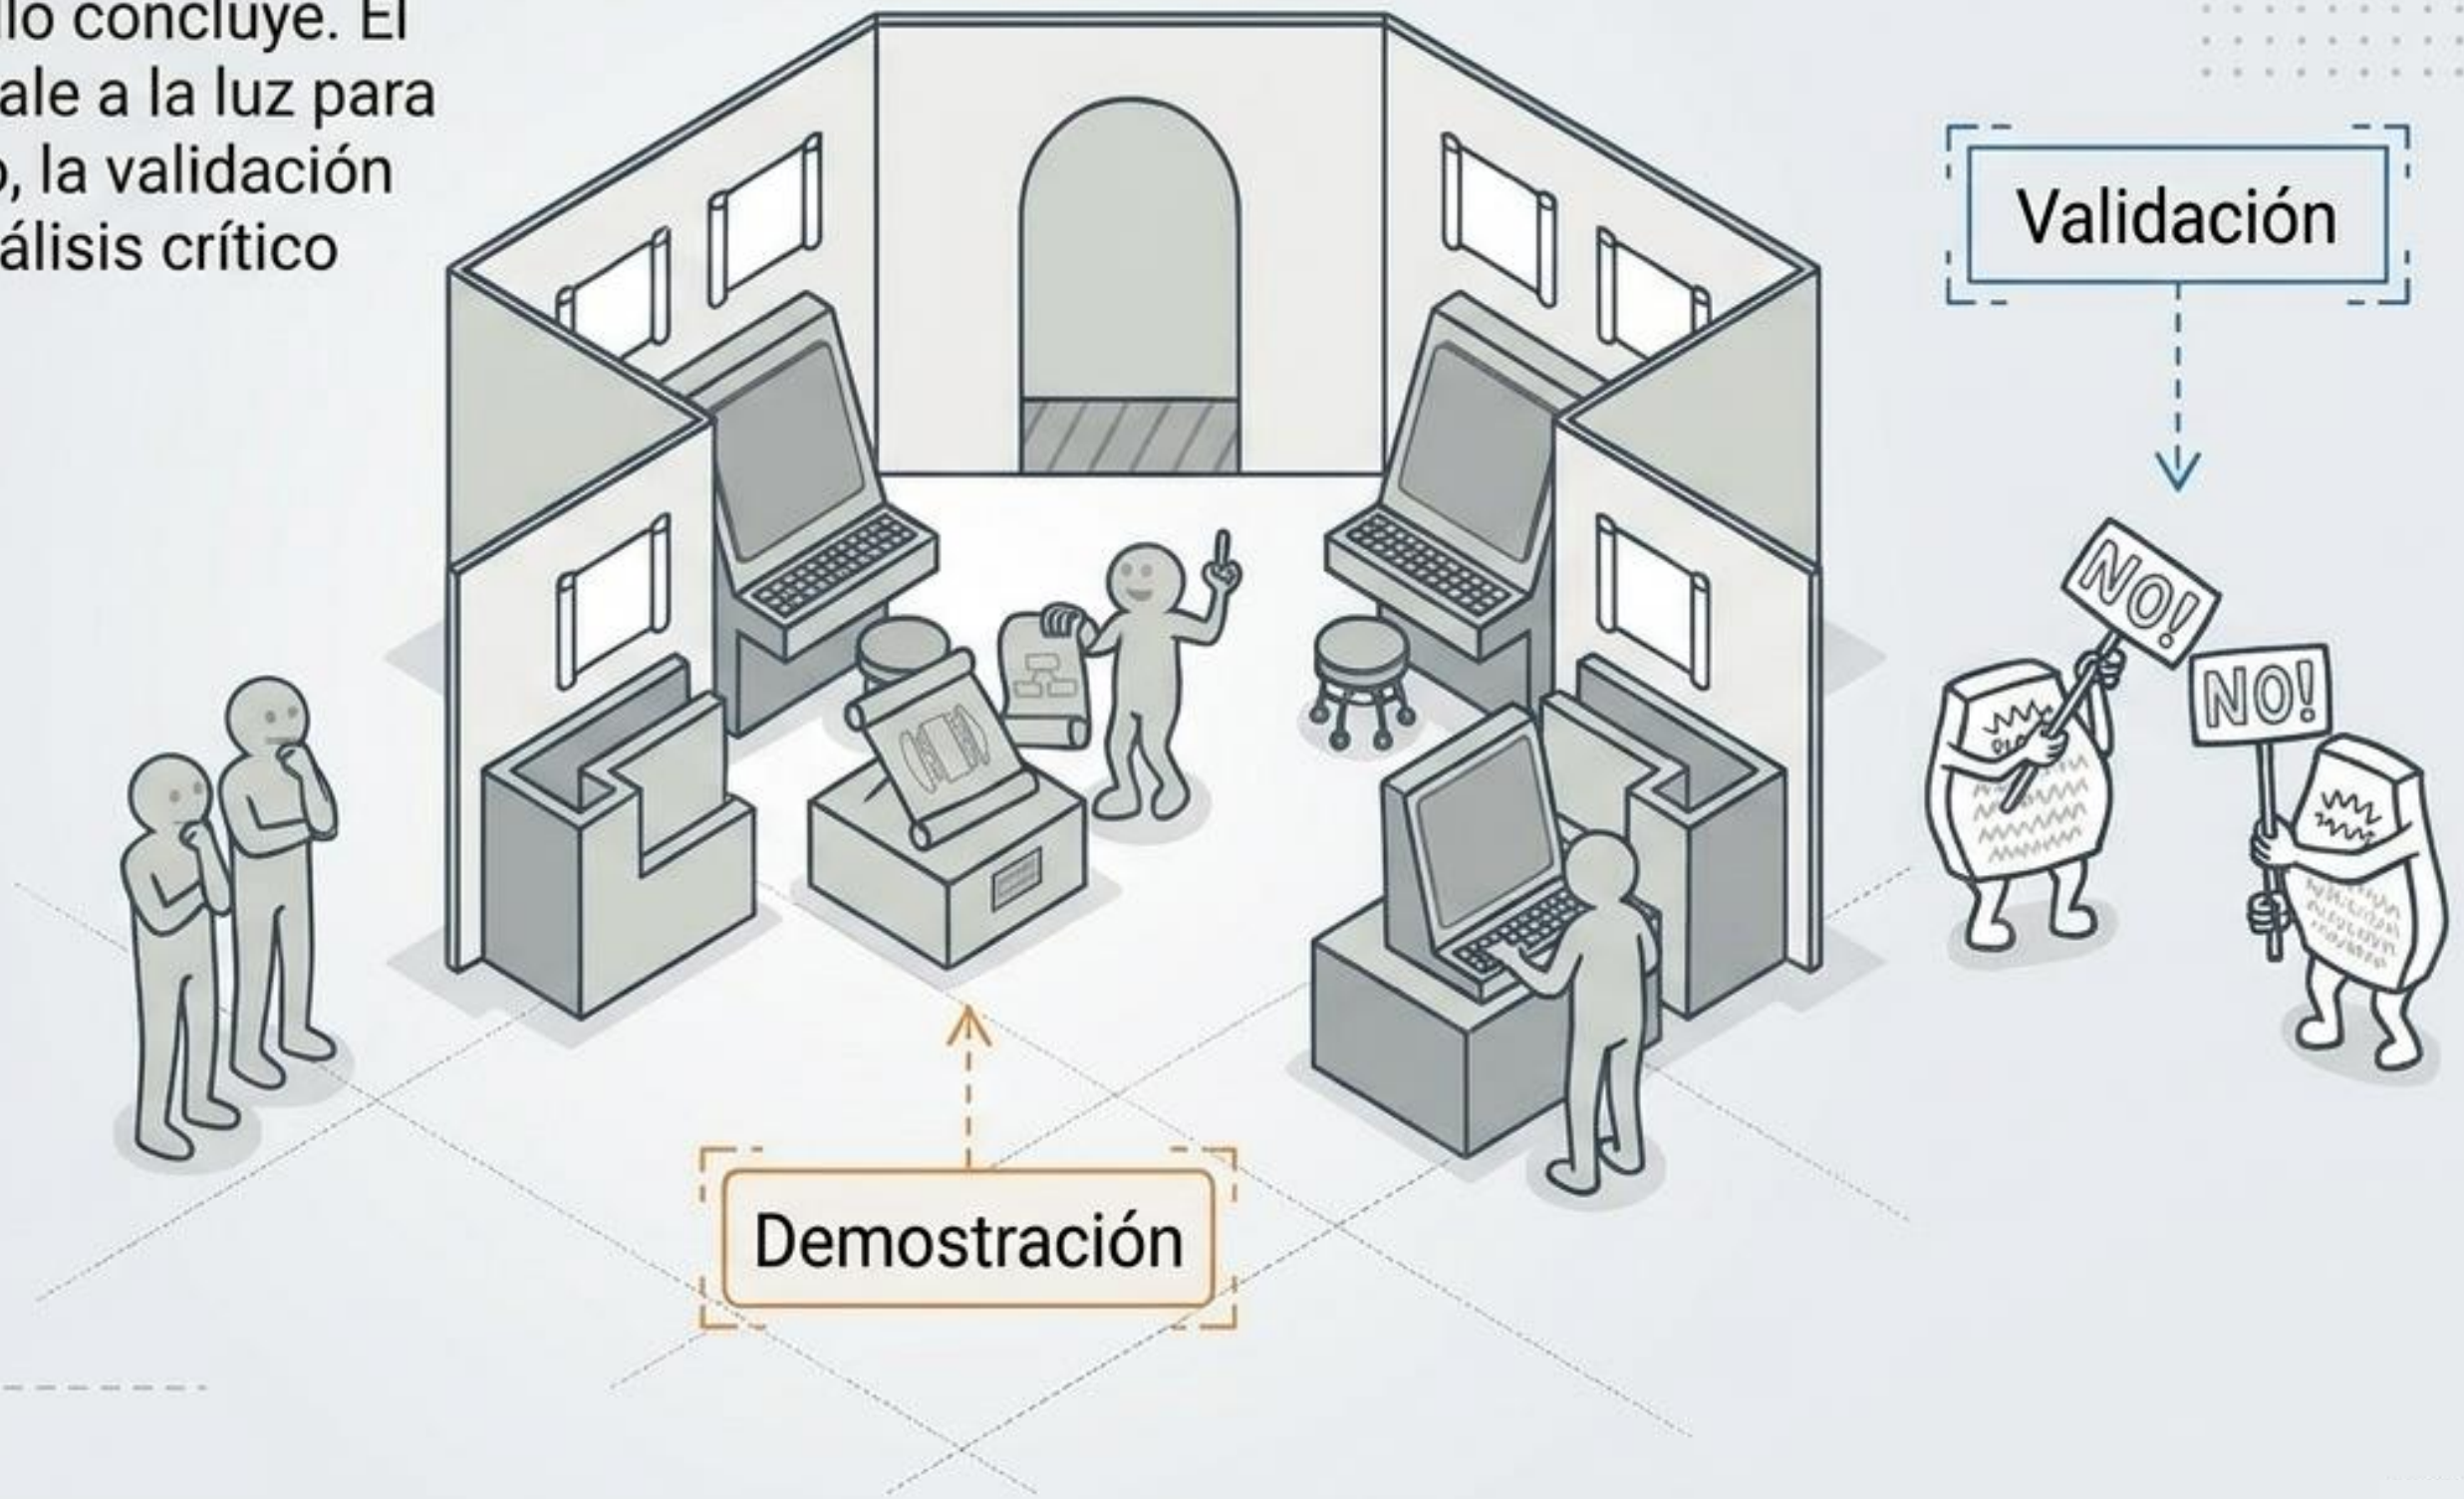

Cierre y Adaptación

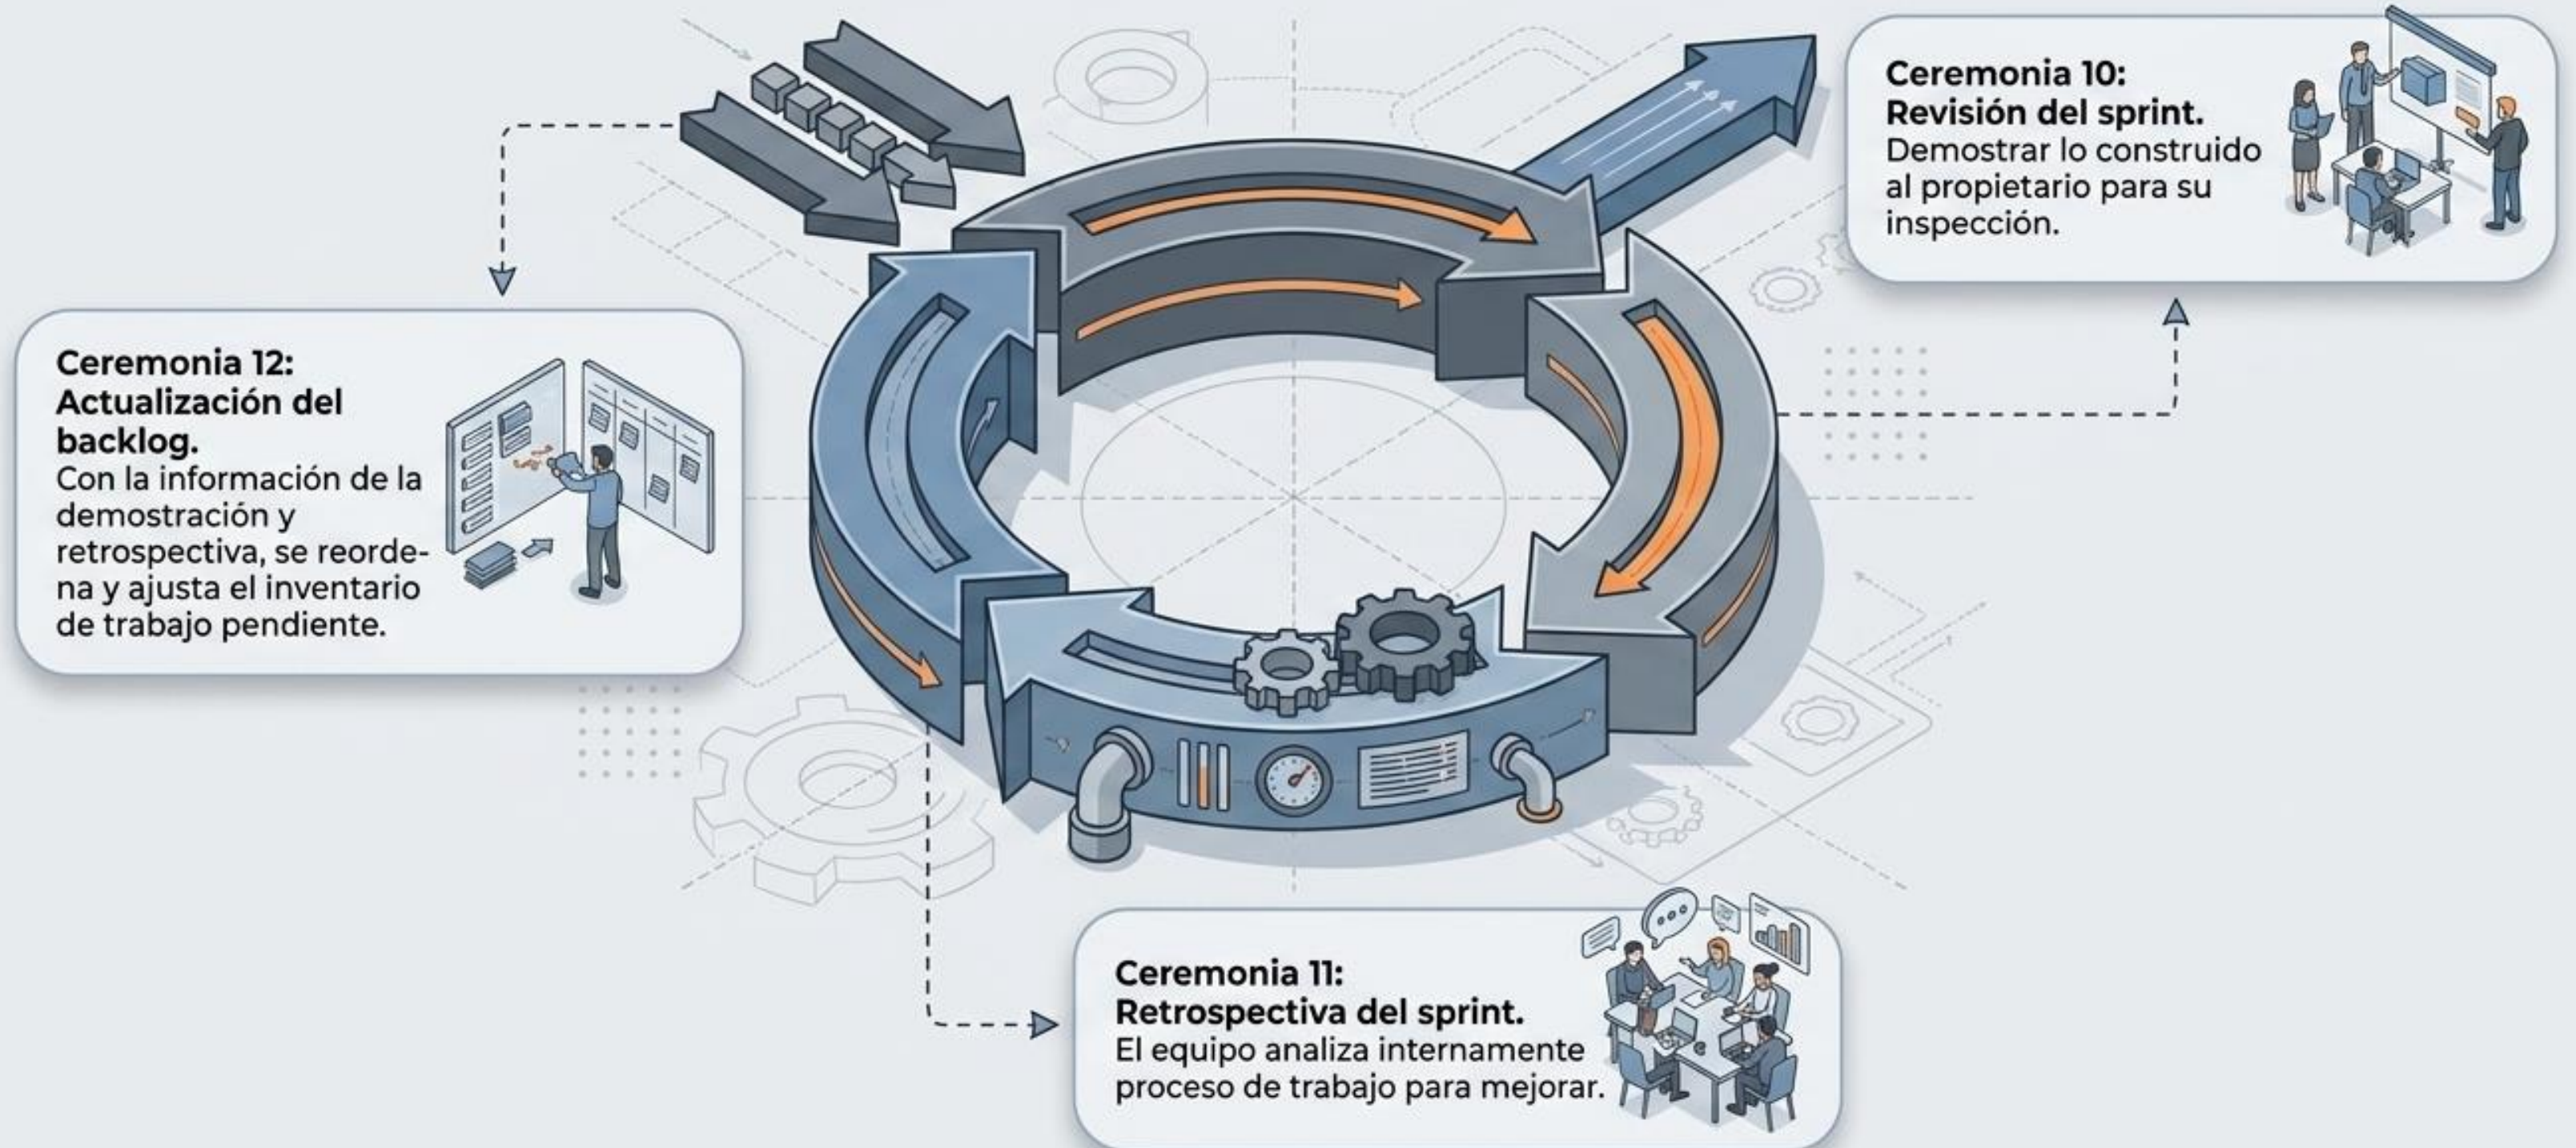

El Patrón Continuo


Al terminar la Ceremonia 12, se inicia un nuevo sprint retomando la secuencia de ceremonias exclusivamente a partir de la sexta. El ciclo 6-12 gira continuamente hasta agotar los sprints establecidos.



Matriz de Responsabilidades: ¿Quién hace qué?

		
Propietario del Producto	Maestro Scrum	Equipo de Desarrollo
Especifica y prioriza historias (C1, C2), acuerda entregas (C5), revisa demostraciones (C10). Representa el objetivo de negocio.	Ayuda en la identificación de requerimientos (C1), facilita y guía el proceso general.	Especifica tareas (C3), estima puntos de historia (C4), construye el producto (C8), realiza reuniones diarias (C9).

El Producto Final

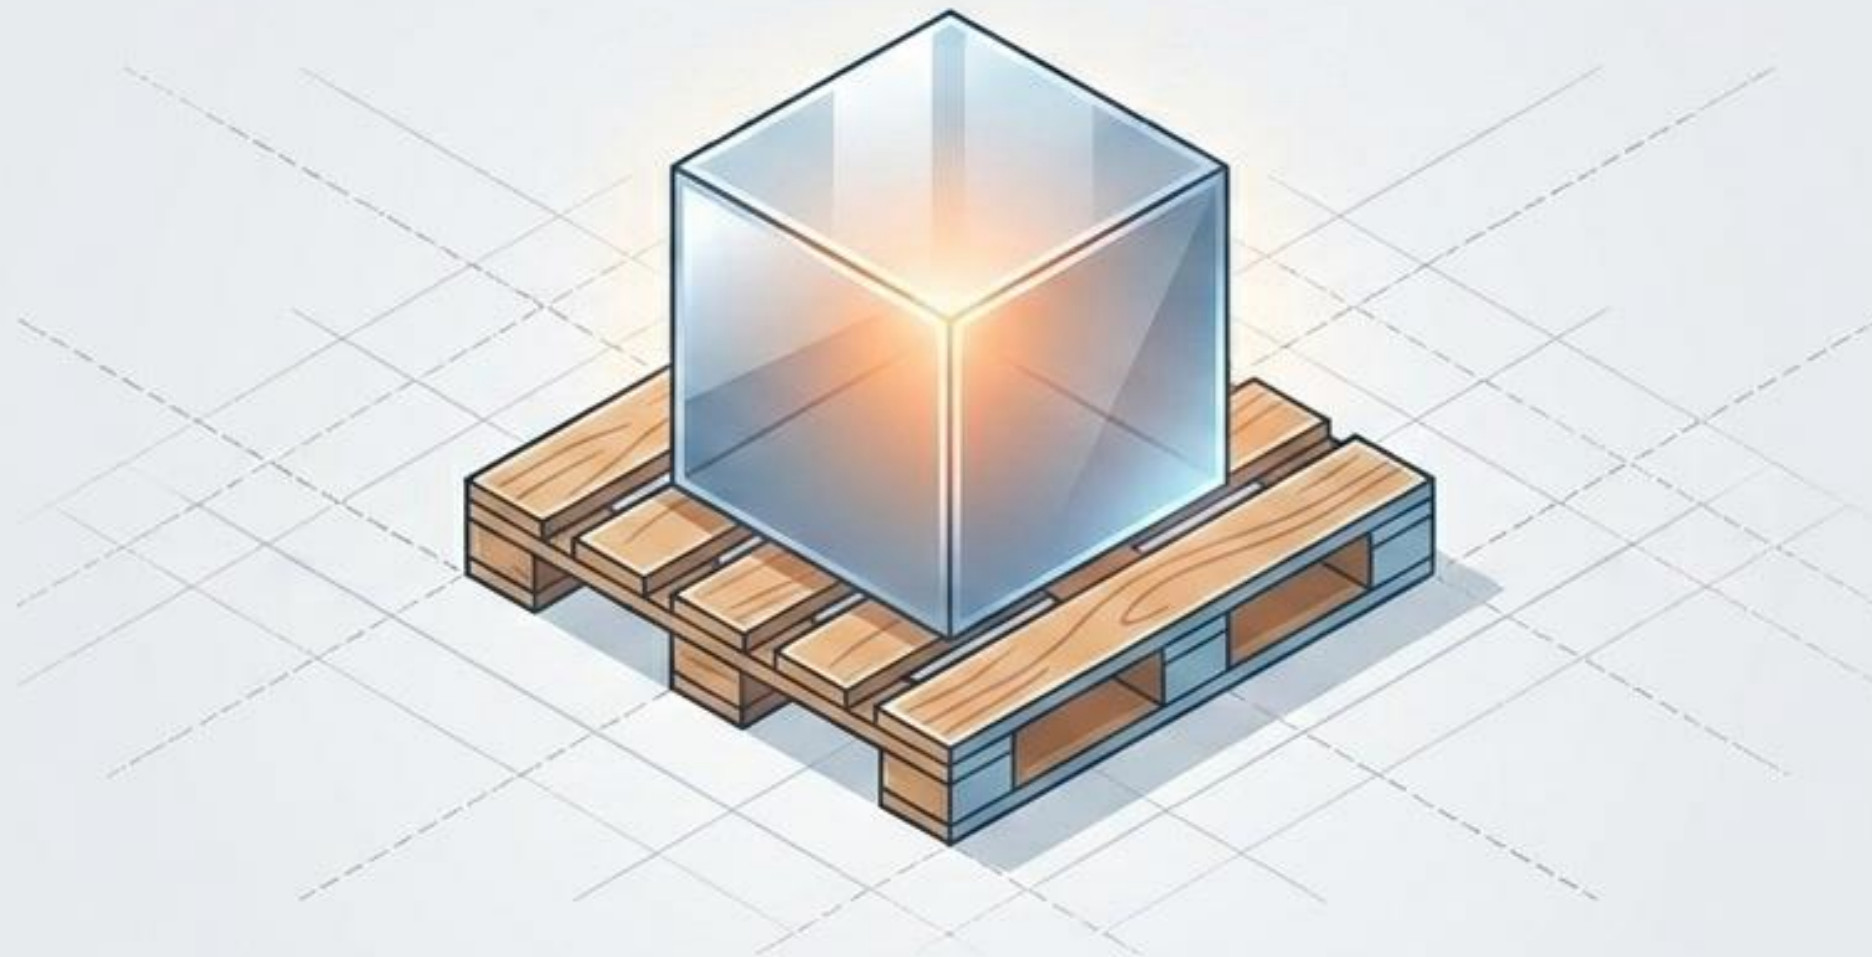

Más sprints se llevan a cabo hasta que se alcanza el número establecido para el proyecto. Al detenerse el motor iterativo, el objetivo ideal se cumple: **se entrega el producto final al propietario.**
